



FORMATION IA — RÉPONDRE AUX APPELS D'OFFRES ÉTANCHÉITÉ AVEC L'IA

MODULE 2

Décider Go/No Go et évaluer la rentabilité
en 30 minutes au lieu de 50 heures

Skill mobilisé : csfe-gonogo-etancheite

DURÉE : 50 minutes

À la fin de ce module, tu seras capable de :

- 1 Construire une grille Go/No Go pondérée à 9 critères, propre à ton entreprise d'étanchéité**
- 2 Appliquer le skill « csfe-gonogo-etancheite » et lire son score /100 + recommandation**
- 3 Identifier les 5 clauses CCAP qui rongent la marge avant de chiffrer**
- 4 Anticiper l'impact trésorerie (prix ferme sans BT01 + GPA 1 an) sur la décision de répondre**

Pourquoi décider AVANT de chiffrer ?

Le coût caché d'un mémoire technique mal calibré pour un marché étanchéité 3 sites :

50 h

Pour rédiger un MT étanchéité de qualité

Préparation + visite obligatoire des 3 sites + rédaction MT + DPGF + relecture. Investissement type pour le marché 26T0002 Saint Gratien.

6 000 €

Coût interne d'un MT loupé

Chargé d'affaires 120 € HT/h × 50h. Pour un AO non gagné, ce coût est sec. Sur 3-4 AO perdus, c'est 24 k€.

30 min

Suffisent pour un Go/No Go solide

Avec le bon skill et la bonne grille. C'est 100× plus rentable que de tout chiffrer pour rien.

× 3

Taux de transformation post-grille

Avec une discipline Go/No Go, les AO retenus deviennent les bons. Moins de gaspillage, plus de marge.

La grille Go/No Go ÉTANCHÉITÉ : 9 critères pondérés / 100

Une grille calibrée pour les marchés étanchéité MAPA et formalisés. Construite collectivement avec tes équipes.

1 Zone géographique 20 pts <i>IDF prioritaire · Saint Gratien (95) à 25 km</i>	2 Type de chantier 15 pts <i>Toiture-terrasse standard > avec amiante > complexe rare</i>	3 Qualifs Qualibat 15 pts <i>3212 étanchéité bitumineuse en feuille détenue</i>
4 Références similaires < 5 ans 15 pts <i>≥ 5 réf. bicouche SBS + ITE laine de roche / PUR</i>	5 Plan de charge équipes 10 pts <i>Disponibilité équipes étanchéité semaines 28 à 38</i>	6 Marge cible 10 pts <i>Minimum 8 % en MAPA (vs prix ferme sans BT01)</i>
7 MO connu 5 pts <i>Track record du donneur d'ordre (collectivité)</i>	8 Délai de réponse 5 pts <i>≥ 30 jours confortable · 23 jours = tendu</i>	9 Solvabilité MO 5 pts <i>Public > privé reconnu (mairie = sûr)</i>

Total : 9 critères = 100 points · Score ≥ 80 = Go · 65-79 = Go conditionnel · < 50 = No Go

Selon ton score /100, voici la recommandation associée :

≥ 80

GO sans réserve

ACTION

Lancer la production du MT immédiatement

DÉTAIL

Tous les critères sont au vert. Mobilise l'équipe études de prix sans attendre, prépare le planning de réponse pour le 5 juin 2026 à 16h00.

65 — 79

GO conditionnel

ACTION

Lever 1 à 3 conditions avant de s'engager

DÉTAIL

Plan de charge à valider · Sous-traitant désamiantage SS3/SS4 à identifier · Ressource métreur à libérer. Décision en arbitrage commercial.

< 50

NO GO (ou < 65 sans levier)

ACTION

Ne pas répondre, archiver, capitaliser

DÉTAIL

Sauf valeur stratégique (référence mairie locale, ouverture client). Ne pas brûler 50 h sur un AO non gagnable.

Le prompt à lancer dans Claude une fois ton DCE analysé :

✓ Skill activé : csfe-gonogo-etancheite

Tu es directeur commercial d'une entreprise d'étanchéité adhérente CSFE. Décide Go/No Go pour cet appel d'offres.

Applique la GRILLE GO/NO GO ÉTANCHÉITÉ — 9 critères pondérés sur 100 :

1. Zone géographique (20 pts) — IDF prioritaire
2. Type de chantier (15 pts) — toiture-terrasse standard / amiante / complexe rare
3. Qualifs Qualibat (15 pts) — 3212 étanchéité bitumineuse en feuille
4. Références similaires < 5 ans (15 pts) — ≥ 5 références
5. Plan de charge équipes étanchéité (10 pts) — disponibilité semaines visées
6. Marge cible (10 pts) — ≥ 8 % en MAPA prix ferme
7. MO connu (5 pts) — 8. Délai (5 pts) — 9. Solvabilité (5 pts)

PRODUIS : tableau détaillé 9 critères + score total /100 + recommandation argumentée + 5 risques chiffrés en € + mesures de mitigation.

Ce que Claude va te restituer :

1

Tableau 9 critères notés

Score + justification pour chaque

2

Note finale /100

Avec recommandation Go /
conditionnel / No Go

3

5 risques chiffrés

En € et en % du marché + mitigation

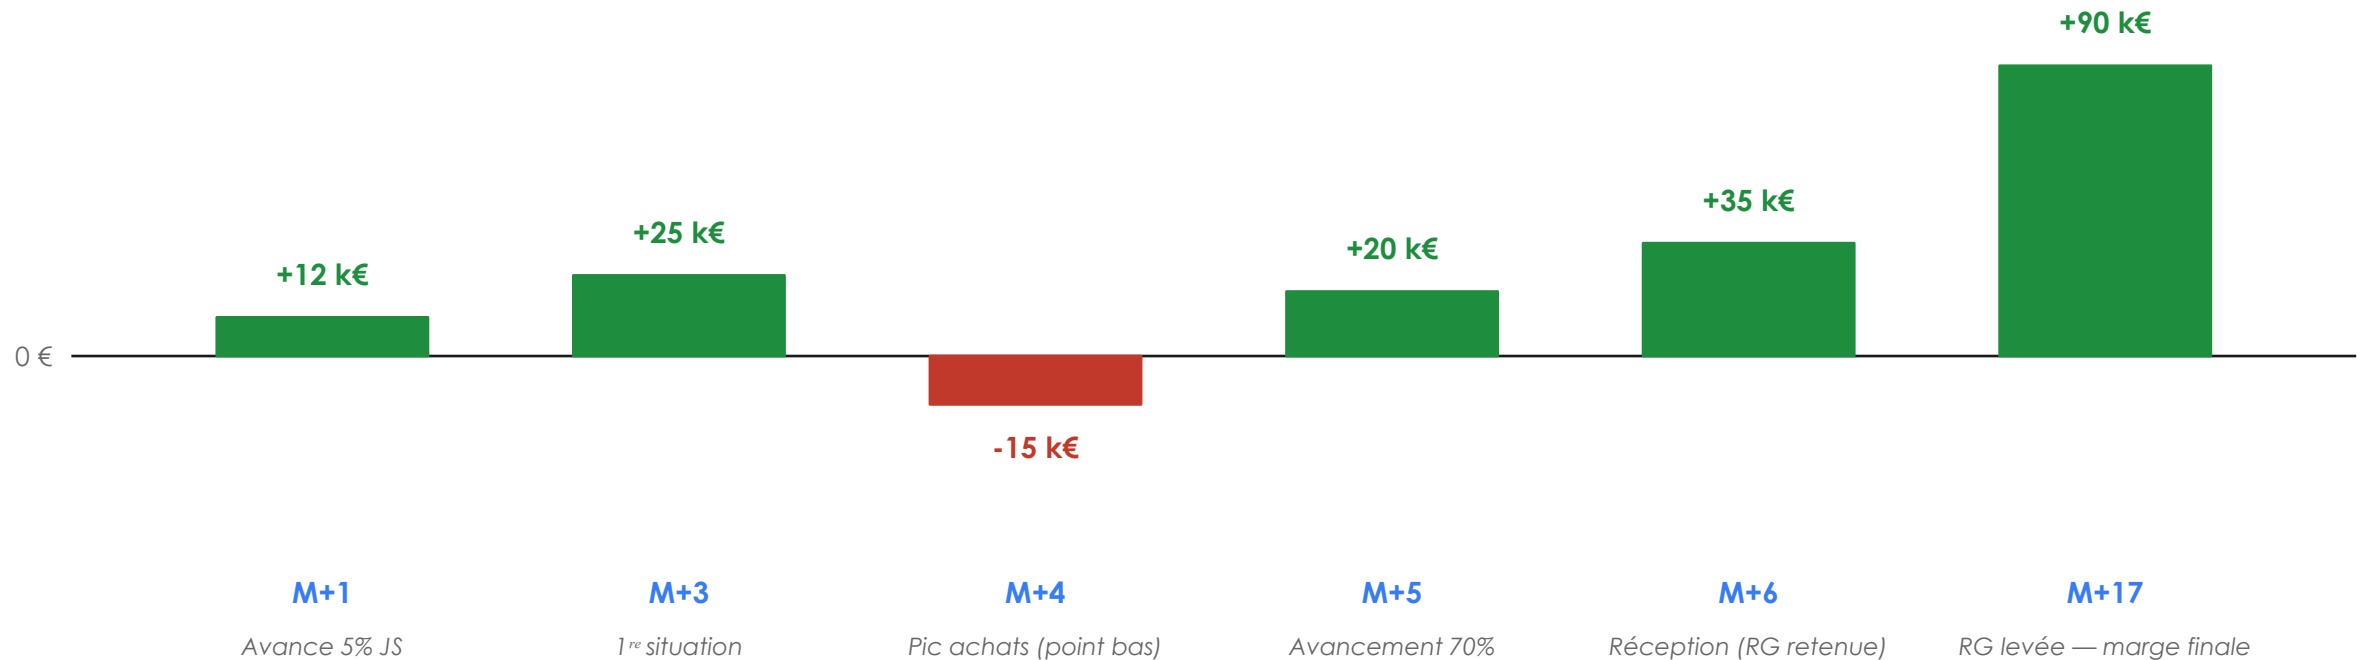
Avant de signer, repère ces 5 clauses dans le CCAP 26T0002 Saint Gratien. Elles peuvent siphonner 5 à 10 % de marge.

1	Retenue de garantie 5 % <i>5 % sur chaque facture, libérée 1 mois après levée des réserves. Sur 600 k€ : 30 k€ bloqués jusqu'à la GPA.</i>	Article 4 CCAP	✓ MITIGATION <i>Demander remplacement par garantie 1ère demande bancaire</i>
2	Cumul pénalités retard 600 €/j <i>300 €/j (art. 9.1.1 retard exécution) + 300 €/j (art. 9.1.5 retard travaux) — franchise 500 €</i>	Articles 9.1.1 + 9.1.5	✓ MITIGATION <i>Sécuriser planning approvisionnement (bitume SBS, laine de roche)</i>
3	Pénalités spécifiques HSE / MT <i>150 €/j EPI · 200 €/j déchets · 500 €/constat sécurité · 300 €/constat non-respect MT contractualisé</i>	Article 9.1.5	✓ MITIGATION <i>Briefer chef d'équipe + s'assurer que le MT reste tenable</i>
4	Prix ferme définitif — PAS de BT01 <i>Aucune révision, aucune actualisation. Inflation 2026 sur bitume + laine de roche + plomb 100 % à ta charge.</i>	Article 3.2 CCAP	✓ MITIGATION <i>Sur-marger les postes matériaux volatiles · clauses fournisseurs fermes</i>
5	Pénalité travail illégal 10 % <i>10 % du montant du contrat (L.8222-6 Code du travail). Sur 600 k€ : 60 k€ d'exposition.</i>	Article 9.1.6	✓ MITIGATION <i>Cadrer rigoureusement la sous-traitance · attestations à jour</i>

Le tueur silencieux des marchés publics : la trésorerie

Pour un marché à 600 k€ HT (3 sites étanchéité) avec GPA 1 an : modélisation trésorerie obligatoire.

Solde de trésorerie cumulé mois par mois (en k€)

**1****Point bas trésorerie : M+4**

-15 k€ à provisionner sur le pic d'achats matériaux (laine de roche, SBS, plomb). Anticiper la ligne BFR bancaire.

2**RG bloquée 1 an**

30 k€ immobilisés pendant la GPA. Préférer une garantie à 1^{ère} demande pour libérer le cash dès la réception.

3**DGD à M+17 (GPA 1 an)**

Le marché n'est financièrement bouclé qu'au bout de ~17 mois après notification. À intégrer dans la décision Go/No Go.

Réunion d'arbitrage : qui décide quoi ?

Le rendu Claude est un support de discussion, pas une décision automatique.





MODULE 2 TERMINÉ

Tu sais maintenant décider avant de te lancer.

Le Go est acté. Maintenant il faut écrire le mémoire technique qui te fera gagner l'AO.

11h00 — 11h15 · PAUSE CAFÉ (15 minutes)

Réveille les neurones · échange avec tes voisins · profite-en pour me poser tes questions

→ **11h15 : MODULE 3 — Rédiger le Mémoire Technique avec l'IA**
